



Généré le 28 septembre 2026 à 06:33 - Septembre 2026

RÉSUMÉ

|                                                                                    |                                                                             |                                                                                               |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <div>AVANCEMENT RÉEL</div> <div>40 %</div> <div>Prévu 41.8 % (écart -1.8 pt)</div> | <div>DÉLAIS</div> <div>4 j de retard</div> <div>Temps écoulé : 58.2 %</div> | <div>BUDGET CONSOMMÉ</div> <div>34.3 %</div> <div>2 124 225 000 GNF / 6 200 000 000 GNF</div> | <div>ÉTAT GLOBAL</div> <div>Vigilance</div> <div>23 fiche(s) · 6 photo(s)</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

IDENTIFICATION

| Champ                | Valeur                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Organisation         | Bâtir Guinée SARL                                            |
| Chantier             | Immeuble R+4 Kipé                                            |
| Client / MOA         | SCI Les Palmiers de Kipé                                     |
| N° contrat           | MA-2026-014                                                  |
| Destinataire rapport | M. Thierno Ousmane DIALLO - Gérant, SCI Les Palmiers de Kipé |
| Localisation         | Kipé, Ratoma - Conakry                                       |
| Statut               | En cours                                                     |
| Planning             | 2026-03-02 -> 2027-02-26                                     |
| Période du rapport   | Septembre 2026                                               |


ANALYSE PLANIFIÉ VS RÉEL

| Indicateur            | Planifié / Réf.   | Réel              | Écart              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Avancement physique   | 41.8 %            | 40 %              | -1.8 pt            |
| Temps vs travaux      | 58.2 % temps      | 40 % travaux      | -18.2 pt           |
| Budget cumulé         | 3 608 400 000 GNF | 2 124 225 000 GNF | -1 484 175 000 GNF |
| Physique vs financier | 40 % phys.        | 34.3 % fin.       | +5.7 pt            |


### Avancement par tâche (réalisé / prévu)




### Planning contractuel - Courbe S planifié vs réalisé

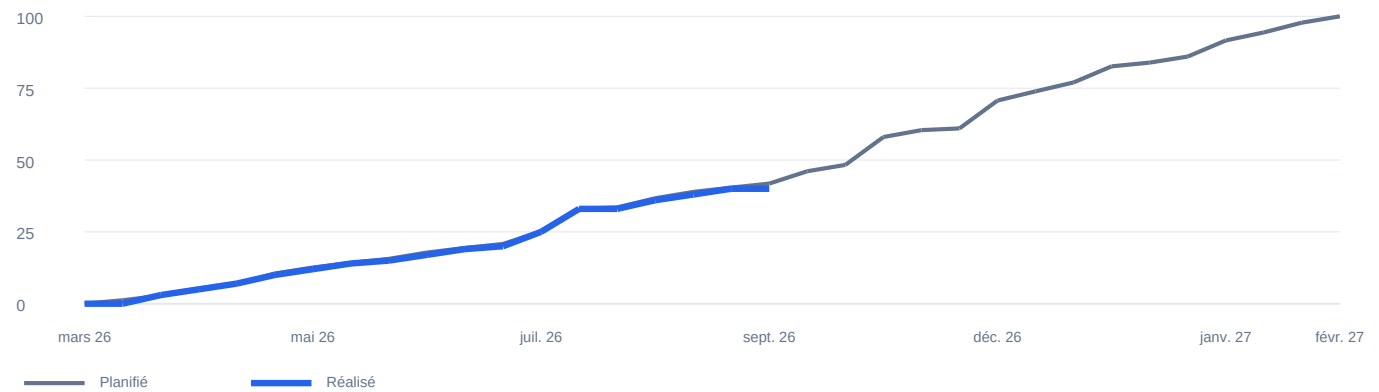

### Temps écoulé vs avancement physique (%)

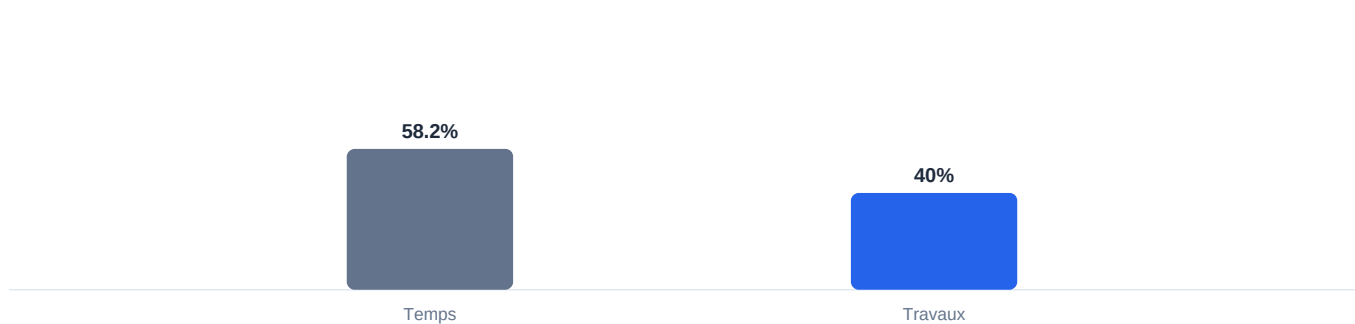


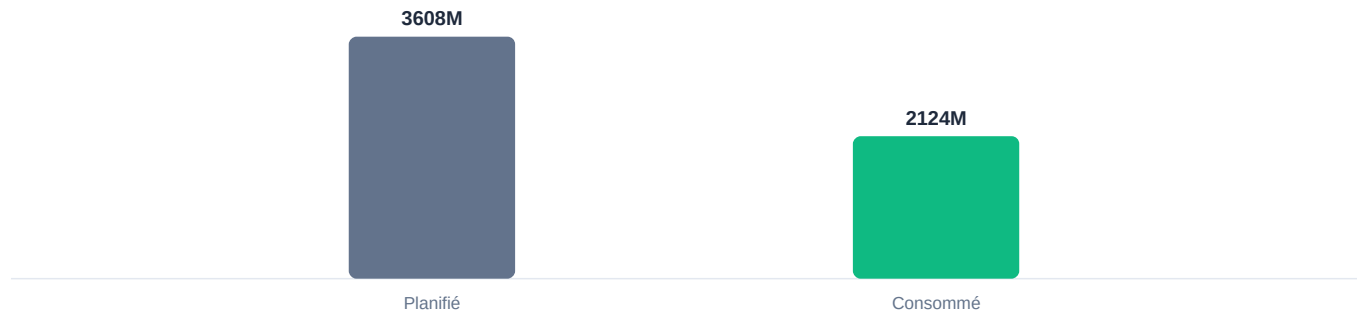**Budget cumulé planifié vs consommé (GNF)**

**PRÉVISIONS - MOIS SUIVANT (OCTOBRE 2026)**


| Tâche                                   | Période                  | Événement | Prévu fin | Actuel |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| Élévation R+2 et R+3                    | 07/09/2026 -> 14/11/2026 | En cours  | 79.4 %    | 23.2 % |
| Réseaux (gainés électricité, plomberie) | 28/09/2026 -> 31/12/2026 | En cours  | 35.1 %    | -      |
| Dalles R+3 et R+4                       | 19/10/2026 -> 19/12/2026 | Démarrage | 19.7 %    | -      |

**SYNTHÈSE DU MOIS**

| Indicateur           | Valeur               |
|----------------------|----------------------|
| Avancement physique  | 35 % -> 40 % (+5 pt) |
| Avancement financier | 34 %                 |
| Retard cumulé        | 4 jour(s)            |
| Budget               | 6 200 000 000 GNF    |
| Dépensé              | 2 124 225 000 GNF    |
| Reste à engager      | 4 075 775 000 GNF    |
| Fiches journalières  | 23 sur la période    |

**Avancement physique (%)**


Activité du mois

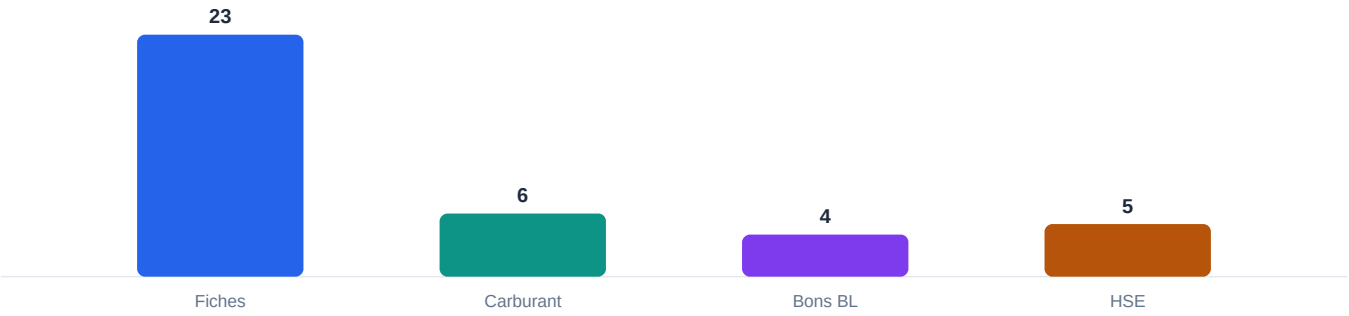


**FICHES JOURNALIÈRES**

| Date          | Avanc. | Eff. | Météo                | Travaux / notes                                                                                                        |
|---------------|--------|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mar. 1 sept.  | 35 %   | 18   | Ensoleillé           | Travaux : coulage dalle R+2 bloc B. Nettoyage et rangement du chantier.                                                |
| mer. 2 sept.  | 36 %   | 19   | Ensoleillé           | Travaux : ferrailage dalle R+2. HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.                                         |
| jeu. 3 sept.  | 36 %   | 26   | Ensoleillé           | Travaux : ferrailage dalle R+2. Visite du bureau de contrôle : RAS.                                                    |
| ven. 4 sept.  | 36 %   | 21   | Averses l'après-midi | Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A. Nettoyage et rangement du chantier.                                             |
| sam. 5 sept.  | 36 %   | 26   | Nuageux              | Travaux : coulage dalle R+2 bloc B.                                                                                    |
| lun. 7 sept.  | 36 %   | 24   | Couvert              | Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A, élévation murs agglos R+3.                                                      |
| mar. 8 sept.  | 37 %   | 19   | Nuageux              | Travaux : ferrailage dalle R+2, ferrailage poutres R+3. Arrêt de 2 h pour forte pluie.                                 |
| mer. 9 sept.  | 37 %   | 20   | Ensoleillé           | Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A, ferrailage poutres R+3. Arrêt de 2 h pour forte pluie.                          |
| jeu. 10 sept. | 37 %   | 22   | Ensoleillé           | Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A, élévation murs agglos R+3.                                                      |
| ven. 11 sept. | 38 %   | 26   | Nuageux              | Travaux : ferrailage dalle R+2, coffrage poteaux R+3. HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.                   |
| sam. 12 sept. | 38 %   | 23   | Ensoleillé           | Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A, ferrailage poutres R+3. Nettoyage et rangement du chantier.                     |
| lun. 14 sept. | 38 %   | 23   | Nuageux              | Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A, ferrailage poutres R+3.                                                         |
| mar. 15 sept. | 39 %   | 21   | Ensoleillé           | Travaux : coulage dalle R+2 bloc B, ferrailage poutres R+3. HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.             |
| mer. 16 sept. | 39 %   | 24   | Pluie matinale       | Travaux : coulage dalle R+2 bloc B, ferrailage poutres R+3. HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.             |
| jeu. 17 sept. | 39 %   | 19   | Ensoleillé           | Travaux : ferrailage dalle R+2, coffrage poteaux R+3.                                                                  |
| ven. 18 sept. | 39 %   | 24   | Nuageux              | Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A, coffrage poteaux R+3.                                                           |
| sam. 19 sept. | 40 %   | 25   | Averses l'après-midi | Travaux : ferrailage dalle R+2, ferrailage poutres R+3. Arrêt de 2 h pour forte pluie.                                 |
| lun. 21 sept. | 40 %   | 19   | Averses l'après-midi | Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A, ferrailage poteaux R+3. HSE : briefing sécurité du lundi, port des EPI vérifié. |
| mar. 22 sept. | 40 %   | 21   | Ensoleillé           | Travaux : coffrage poteaux R+3 (P1 à P8). Livraison de 300 sacs de ciment CPJ 42.5 réceptionnée.                       |

| Date          | Avanc. | Eff. | Météo          | Travaux / notes                                                                              |
|---------------|--------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| mer. 23 sept. | 40 %   | 19   | Couvert        | Travaux : élévation murs agglos R+3 façade nord. Arrêt de 2 h pour forte pluie l'après-midi. |
| jeu. 24 sept. | 40 %   | 20   | Nuageux        | Travaux : ferrailage poutres R+3, réception des aciers HA10 / HA12.                          |
| ven. 25 sept. | 40 %   | 26   | Ensoleillé     | Travaux : coulage poteaux R+3 (8 m³). Visite du bureau de contrôle : RAS.                    |
| sam. 26 sept. | 40 %   | 23   | Pluie matinale | Travaux : maçonnerie R+3 et nettoyage de fin de semaine.                                     |

Évolution de l'avancement journalier (%)



Effectif moyen : 22 ouvrier(s) / jour

**CARBURANT**

| Indicateur          | Valeur         |
|---------------------|----------------|
| Total litres        | 1 340 L        |
| Coût total          | 16 080 000 GNF |
| Relevés / anomalies | 6 / 1          |

| Date       | Litres | Statut   |
|------------|--------|----------|
| 03/09/2026 | 240    | Normal   |
| 11/09/2026 | 230    | Normal   |
| 12/09/2026 | 410    | Anomalie |
| 16/09/2026 | 135    | Normal   |
| 21/09/2026 | 160    | Normal   |
| 24/09/2026 | 165    | Normal   |

**BONS DE LIVRAISON**

| Résumé         | Valeur         |
|----------------|----------------|
| Nombre de bons | 4              |
| Montant total  | 85 300 000 GNF |

| Référence    | Fournisseur             | Montant        | Date       |
|--------------|-------------------------|----------------|------------|
| BL-2026-0349 | Agglos Matoto           | 22 000 000 GNF | 10/09/2026 |
| BL-2026-0353 | Cimenterie de Conakry   | 28 500 000 GNF | 22/09/2026 |
| BL-2026-0355 | Fer et Aciers de Kaloum | 19 800 000 GNF | 24/09/2026 |
| BL-2026-0356 | Carrière de Kagbélen    | 15 000 000 GNF | 25/09/2026 |

## HSE ET PIÈCES JOINTES

| Élément           | Détail                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mentions sécurité | 5 dans les fiches                                                                                          |
| Documents déposés | 6 (HSE / photos)                                                                                           |
| Note 1            | Travaux : ferrailage dalle R+2. HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.                             |
| Note 2            | Travaux : ferrailage dalle R+2, coffrage poteaux R+3. HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.       |
| Note 3            | Travaux : coulage dalle R+2 bloc B, ferrailage poutres R+3. HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié. |

## PHOTOS DU CHANTIER



Briefing securite HSE

21 sept. 2026



Coffrage poteaux R+2

22 sept. 2026


**Livraison ciment 300 sacs**

22 sept. 2026


**Elevation murs agglos R+3**

23 sept. 2026


**Ferrailage poutres R+3**

24 sept. 2026


**Coulage dalle R+2**

25 sept. 2026

## COMMENTAIRE CHEF DE CHANTIER

Septembre : structure du R+2 achevée, maçonnerie du R+1 à 80 %. Avancement conforme au planning de référence. Point de vigilance : délais de livraison du fer HA12 (3 jours de retard en moyenne).

## VALIDATION

### Établi par (chef de chantier)

Nom : Ibrahima SOW

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

### Visa du maître d'ouvrage

Nom : M. Thierno Ousmane DIALLO - Gérant, SCI Les Palmi...

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_
