



Généré le 28 septembre 2026 à 06:34 - Année 2026

RÉSUMÉ

AVANCEMENT RÉEL 40 % Prévu 41.8 % (écart -1.8 pt)	DÉLAIS 4 j de retard Temps écoulé : 58.2 %	BUDGET CONSOMMÉ 34.3 % 2 124 225 000 GNF / 6 200 000 000 GNF	ÉTAT GLOBAL Vigilance 59 fiche(s) · 6 photo(s)
--	---	---	---

IDENTIFICATION

Champ	Valeur
Organisation	Bâtir Guinée SARL
Chantier	Immeuble R+4 Kipé
Client / MOA	SCI Les Palmiers de Kipé
N° contrat	MA-2026-014
Destinataire rapport	M. Thierno Ousmane DIALLO - Gérant, SCI Les Palmiers de Kipé
Localisation	Kipé, Ratoma - Conakry
Statut	En cours
Planning	2026-03-02 -> 2027-02-26
Période du rapport	Année 2026


ANALYSE PLANIFIÉ VS RÉEL

Indicateur	Planifié / Réf.	Réel	Écart
Avancement physique	41.8 %	40 %	-1.8 pt
Temps vs travaux	58.2 % temps	40 % travaux	-18.2 pt
Budget cumulé	3 608 400 000 GNF	2 124 225 000 GNF	-1 484 175 000 GNF
Physique vs financier	40 % phys.	34.3 % fin.	+5.7 pt


Avancement par tâche (réalisé / prévu)




Planning contractuel - Courbe S planifié vs réalisé

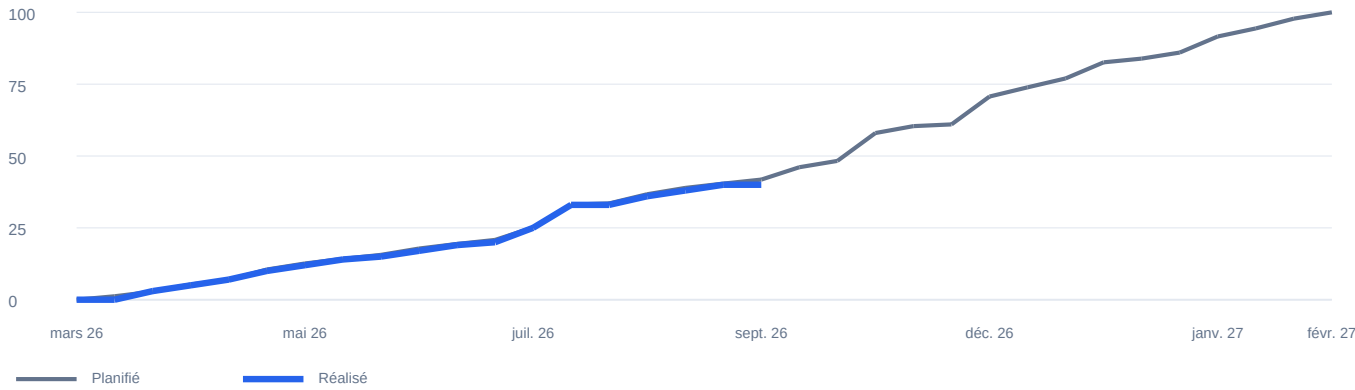

Temps écoulé vs avancement physique (%)

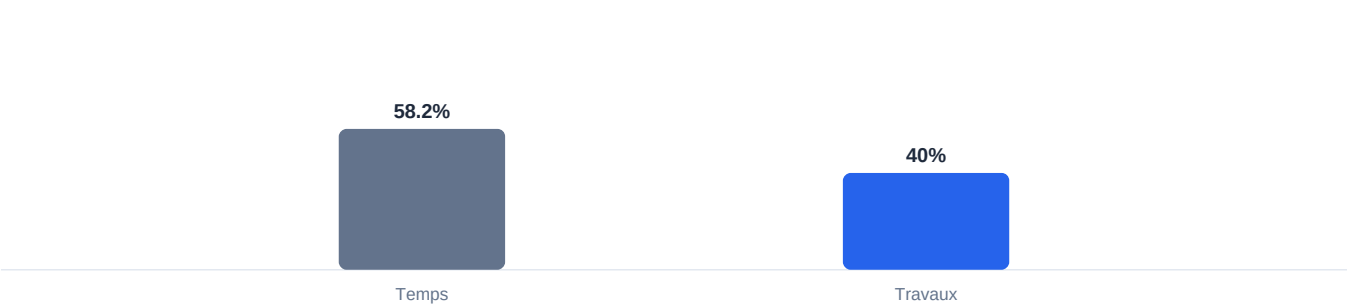


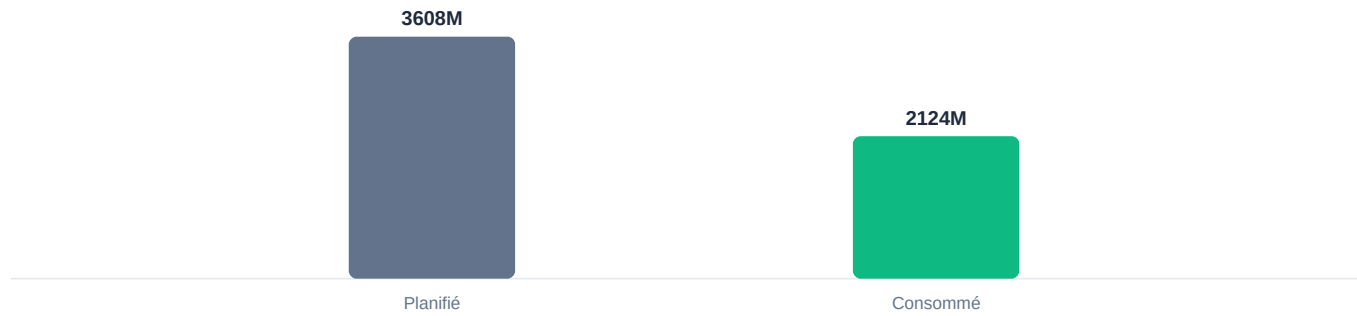Budget cumulé planifié vs consommé (GNF)

PRÉVISIONS - ANNÉE SUIVANTE (2027)


Tâche	Période	Événement	Prévu fin	Actuel
Enduits et revêtements	16/11/2026 -> 12/02/2027	Fin prévue	100 %	-
Toiture-terrasse et étanchéité	14/12/2026 -> 23/01/2027	Fin prévue	100 %	-
Menuiseries et peinture	11/01/2027 -> 26/02/2027	Démarrage	100 %	-

SYNTHÈSE DE L'ANNÉE

Indicateur	Valeur
Avancement physique	3 % -> 40 % (+37 pt)
Avancement financier	34 %
Retard cumulé	4 jour(s)
Budget	6 200 000 000 GNF
Dépensé	2 124 225 000 GNF
Reste à engager	4 075 775 000 GNF
Fiches journalières	59 sur la période

Avancement physique (%)


Activité de l'année

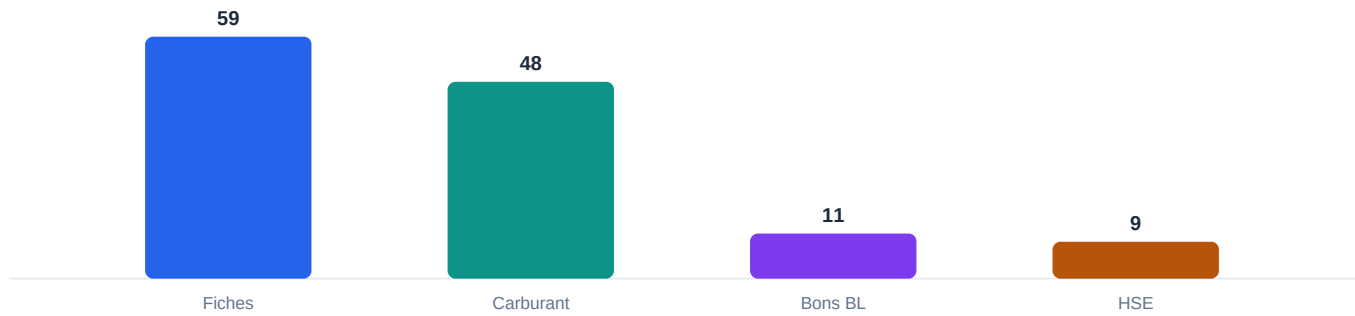

FICHES JOURNALIÈRES

Date	Avanc.	Eff.	Météo	Travaux / notes
ven. 13 mars	3 %	24	Nuageux	Travaux : installation de chantier, terrassements et fouilles.
ven. 20 mars	4 %	20	Couvert	Travaux : terrassements et fouilles. Nettoyage et rangement du chantier.
ven. 27 mars	5 %	25	Nuageux	Travaux : terrassements et fouilles. Arrêt de 2 h pour forte pluie.
ven. 3 avr.	7 %	21	Pluie matinale	Travaux : terrassements et fouilles, fondations (semelles, longrines).
ven. 10 avr.	8 %	23	Nuageux	Travaux : fondations (semelles, longrines). Visite du bureau de contrôle : RAS.
ven. 17 avr.	9 %	21	Nuageux	Travaux : fondations (semelles, longrines).
ven. 24 avr.	10 %	25	Nuageux	Travaux : fondations (semelles, longrines). Nettoyage et rangement du chantier.
ven. 1 mai	11 %	18	Ensoleillé	Travaux : fondations (semelles, longrines). HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.
ven. 8 mai	12 %	24	Averses l'après-midi	Travaux : fondations (semelles, longrines).
ven. 15 mai	14 %	20	Pluie matinale	Travaux : fondations (semelles, longrines), soubassement et dallage rdc. Nettoyage et rangement du chantier.
ven. 22 mai	15 %	24	Nuageux	Travaux : soubassement et dallage rdc.
ven. 29 mai	16 %	18	Averses l'après-midi	Travaux : soubassement et dallage rdc. Arrêt de 2 h pour forte pluie.
ven. 5 juin	17 %	26	Nuageux	Travaux : soubassement et dallage rdc. Arrêt de 2 h pour forte pluie.
ven. 12 juin	19 %	21	Pluie matinale	Travaux : soubassement et dallage rdc, élévation murs R+1. Visite du bureau de contrôle : RAS.
ven. 19 juin	20 %	24	Nuageux	Travaux : chaînages R+1. HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.
ven. 26 juin	22 %	19	Ensoleillé	Travaux : élévation murs R+1. Arrêt de 2 h pour forte pluie.
ven. 3 juil.	23 %	24	Pluie matinale	Travaux : élévation murs R+1. Arrêt de 2 h pour forte pluie.
ven. 10 juil.	24 %	23	Nuageux	Travaux : élévation murs R+1. Nettoyage et rangement du chantier.
ven. 17 juil.	25 %	25	Pluie matinale	Travaux : chaînages R+1.
ven. 24 juil.	27 %	18	Ensoleillé	Travaux : élévation murs R+1, décoffrage dalle R+2 bloc A. Arrêt de 2 h pour forte pluie.
ven. 31 juil.	29 %	25	Nuageux	Travaux : chaînages R+1, ferrailage dalle R+2. Arrêt de 2 h pour forte pluie.

Date	Avanc.	Eff.	Météo	Travaux / notes
ven. 7 août	31 %	25	Nuageux	Travaux : élévation murs R+1, décoffrage dalle R+2 bloc A. Arrêt de 2 h pour forte pluie.
ven. 14 août	33 %	18	Nuageux	Travaux : chaînages R+1, ferrailage dalle R+2. Nettoyage et rangement du chantier.
lun. 17 août	33 %	20	Averses l'après-midi	Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A. HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.
mar. 18 août	33 %	18	Ensoleillé	Travaux : coulage dalle R+2 bloc B. Visite du bureau de contrôle : RAS.
mer. 19 août	34 %	22	Ensoleillé	Travaux : coulage dalle R+2 bloc B.
jeu. 20 août	34 %	24	Couvert	Travaux : ferrailage dalle R+2.
ven. 21 août	34 %	19	Averses l'après-midi	Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A. Visite du bureau de contrôle : RAS.
sam. 22 août	34 %	22	Ensoleillé	Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A. Nettoyage et rangement du chantier.
lun. 24 août	34 %	23	Couvert	Travaux : coulage dalle R+2 bloc B. Arrêt de 2 h pour forte pluie.
mar. 25 août	34 %	25	Ensoleillé	Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A. HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.
mer. 26 août	35 %	25	Couvert	Travaux : ferrailage dalle R+2. Visite du bureau de contrôle : RAS.
jeu. 27 août	35 %	24	Nuageux	Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A.
ven. 28 août	35 %	19	Ensoleillé	Travaux : ferrailage dalle R+2. Arrêt de 2 h pour forte pluie.
sam. 29 août	35 %	20	Ensoleillé	Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A. Nettoyage et rangement du chantier.
lun. 31 août	35 %	18	Pluie matinale	Travaux : ferrailage dalle R+2. Nettoyage et rangement du chantier.
mar. 1 sept.	35 %	18	Ensoleillé	Travaux : coulage dalle R+2 bloc B. Nettoyage et rangement du chantier.
mer. 2 sept.	36 %	19	Ensoleillé	Travaux : ferrailage dalle R+2. HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.
jeu. 3 sept.	36 %	26	Ensoleillé	Travaux : ferrailage dalle R+2. Visite du bureau de contrôle : RAS.
ven. 4 sept.	36 %	21	Averses l'après-midi	Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A. Nettoyage et rangement du chantier.
sam. 5 sept.	36 %	26	Nuageux	Travaux : coulage dalle R+2 bloc B.
lun. 7 sept.	36 %	24	Couvert	Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A, élévation murs agglos R+3.
mar. 8 sept.	37 %	19	Nuageux	Travaux : ferrailage dalle R+2, ferrailage poutres R+3. Arrêt de 2 h pour forte pluie.
mer. 9 sept.	37 %	20	Ensoleillé	Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A, ferrailage poutres R+3. Arrêt de 2 h pour forte pluie.
jeu. 10 sept.	37 %	22	Ensoleillé	Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A, élévation murs agglos R+3.
ven. 11 sept.	38 %	26	Nuageux	Travaux : ferrailage dalle R+2, coffrage poteaux R+3. HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.
sam. 12 sept.	38 %	23	Ensoleillé	Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A, ferrailage poutres R+3. Nettoyage et rangement du chantier.
lun. 14 sept.	38 %	23	Nuageux	Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A, ferrailage poutres R+3.
mar. 15 sept.	39 %	21	Ensoleillé	Travaux : coulage dalle R+2 bloc B, ferrailage poutres R+3. HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.

Date	Litres	Statut
26/03/2026	235	Normal
31/03/2026	140	Normal
04/04/2026	245	Normal

BONS DE LIVRAISON

Résumé	Valeur
Nombre de bons	11
Montant total	273 650 000 GNF

Référence	Fournisseur	Montant	Date
BL-2026-0331	Carrière de Kagbélen	20 300 000 GNF	22/03/2026
BL-2026-0332	Carrière de Kagbélen	20 300 000 GNF	21/04/2026
BL-2026-0333	Carrière de Kagbélen	20 300 000 GNF	21/05/2026
BL-2026-0334	Cimenterie de Conakry	38 000 000 GNF	20/06/2026
BL-2026-0335	Fer et Aciers de Kaloum	29 850 000 GNF	20/07/2026
BL-2026-0336	Cimenterie de Conakry	38 000 000 GNF	19/08/2026
BL-2026-0348	Bois et Coffrage Madina	21 600 000 GNF	31/08/2026
BL-2026-0349	Agglos Matoto	22 000 000 GNF	10/09/2026
BL-2026-0353	Cimenterie de Conakry	28 500 000 GNF	22/09/2026
BL-2026-0355	Fer et Aciers de Kaloum	19 800 000 GNF	24/09/2026
BL-2026-0356	Carrière de Kagbélen	15 000 000 GNF	25/09/2026

HSE ET PIÈCES JOINTES

Élément	Détail
Mentions sécurité	9 dans les fiches
Documents déposés	6 (HSE / photos)
Note 1	Travaux : fondations (semelles, longrines). HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.
Note 2	Travaux : chaînages R+1. HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.
Note 3	Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A. HSE : briefing sécurité, port des EPI vérifié.

PHOTOS DU CHANTIER**Briefing securite HSE**

21 sept. 2026

**Coffrage poteaux R+2**

22 sept. 2026

**Livraison ciment 300 sacs**

22 sept. 2026

**Elevation murs agglos R+3**

23 sept. 2026

**Ferraillage poutres R+3**

24 sept. 2026

**Coulage dalle R+2**

25 sept. 2026

COMMENTAIRE CHEF DE CHANTIER

Bilan 2026 : gros œuvre avancé conformément au marché, aucun accident avec arrêt. Priorités 2027 : second œuvre, réception partielle des niveaux bas.

VALIDATION

Établi par (chef de chantier)

Nom : Ibrahima SOW

Date : _____

Signature :

Visa du maître d'ouvrage

Nom : M. Thierno Ousmane DIALLO - Gérant, SCI Les Palmi...

Date : _____

Signature :
