

Immeuble R+4 Kipé

Semaine 39 - du 21 septembre 2026 au 27 septembre 2026

Généré le 28 septembre 2026 à 06:35 - Semaine 39 - du 21 septembre 2026 au 27 septembre 2026

RÉSUMÉ

AVANCEMENT RÉEL 40 % Prévu 41.7 % (écart -1.7 pt)	DÉLAIS 4 j de retard Temps écoulé : 57.9 %	EFFECTIF MOYEN 21 / jour ouvriers présents sur la période	ÉTAT GLOBAL Vigilance 6 fiche(s) · 6 photo(s)
--	---	--	--


IDENTIFICATION

Champ	Valeur
Organisation	Bâtir Guinée SARL
Chantier	Immeuble R+4 Kipé
Client / MOA	SCI Les Palmiers de Kipé
N° contrat	MA-2026-014
Destinataire rapport	M. Thierno Ousmane DIALLO - Gérant, SCI Les Palmiers de Kipé
Localisation	Kipé, Ratoma - Conakry
Statut	En cours
Planning	2026-03-02 -> 2027-02-26
Période du rapport	Semaine 39 - du 21 septembre 2026 au 27 septembre 2026


ANALYSE PLANIFIÉ VS RÉEL

Indicateur	Planifié / Réf.	Réel	Écart
Avancement physique	41.7 %	40 %	-1.7 pt
Temps vs travaux	57.9 % temps	40 % travaux	-17.9 pt


Avancement par tâche (réalisé / prévu)

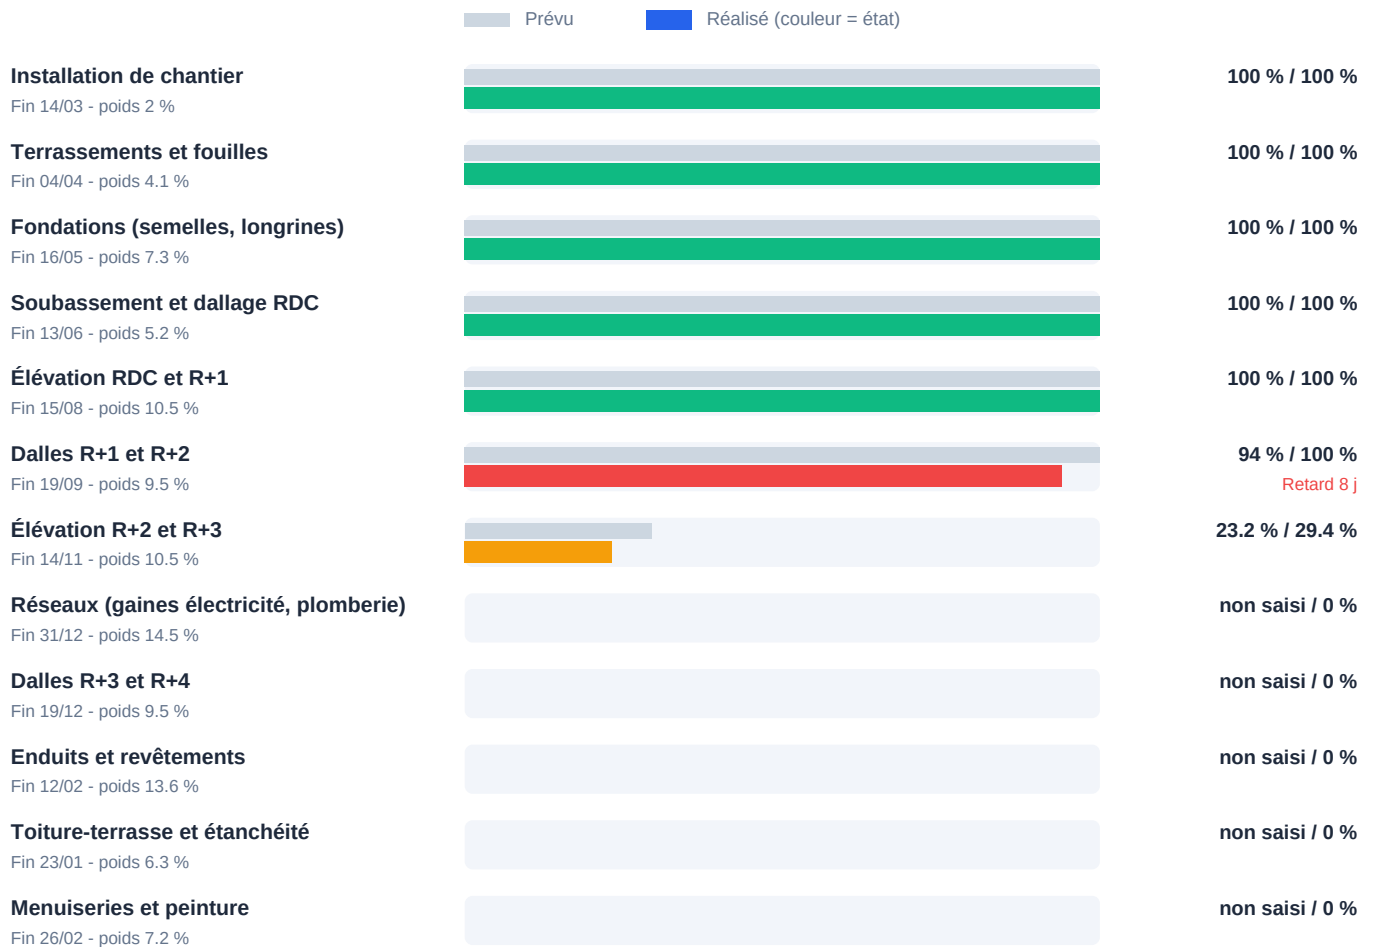

Planning contractuel - Courbe S planifié vs réalisé

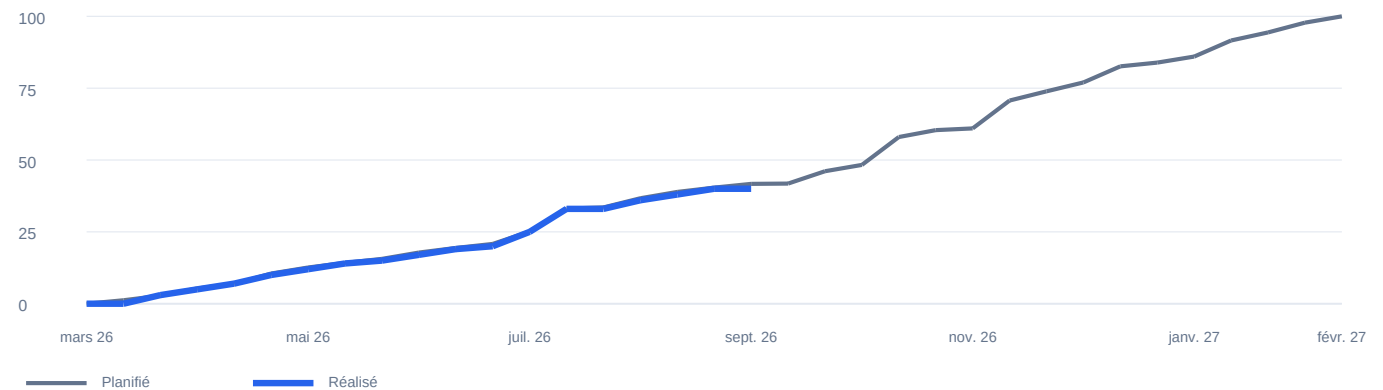

Temps écoulé vs avancement physique (%)

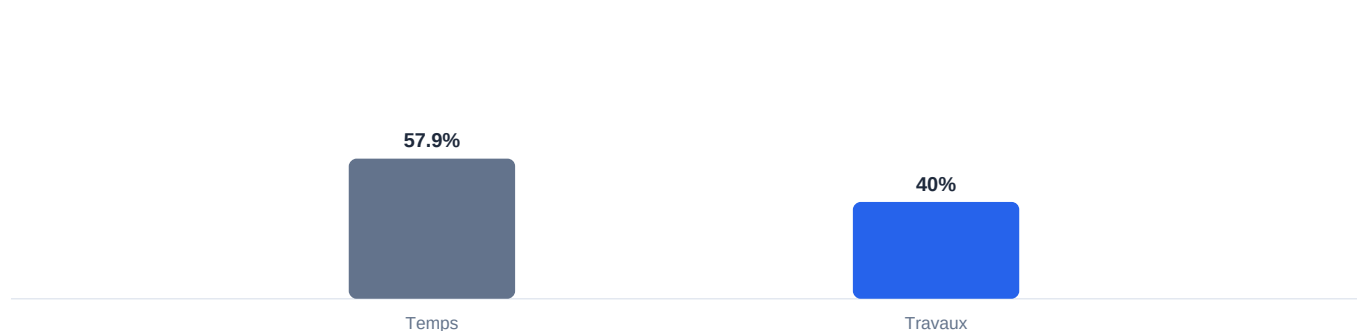

PRÉVISIONS - SEMAINE SUIVANTE (28 SEPT. - 4 OCT.)

Tâche	Période	Événement	Prévu fin	Actuel
Élévation R+2 et R+3	07/09/2026 -> 14/11/2026	En cours	39.7 %	23.2 %
Réseaux (gainés électricité, plomberie)	28/09/2026 -> 31/12/2026	Démarrage	6.4 %	-


SYNTHÈSE DE LA SEMAINE

Indicateur	Valeur
Avancement physique	40 % -> 40 % (+0 pt)
Retard cumulé	4 jour(s)
Fiches journalières	6 sur la période

Avancement physique (%)



Activité de la semaine

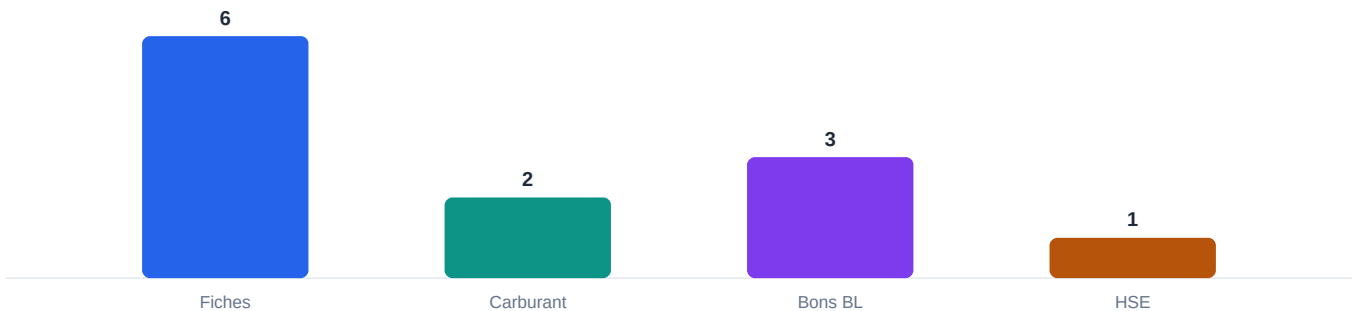

FICHES JOURNALIÈRES

Date	Avanc.	Eff.	Météo	Travaux / notes
lun. 21 sept.	40 %	19	Averses l'après-midi	Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A, ferrailage poteaux R+3. HSE : briefing sécurité du lundi, port des EPI vérifié.
mar. 22 sept.	40 %	21	Ensoleillé	Travaux : coffrage poteaux R+3 (P1 à P8). Livraison de 300 sacs de ciment CPJ 42.5 réceptionnée.
mer. 23 sept.	40 %	19	Couvert	Travaux : élévation murs agglos R+3 façade nord. Arrêt de 2 h pour forte pluie l'après-midi.
jeu. 24 sept.	40 %	20	Nuageux	Travaux : ferrailage poutres R+3, réception des aciers HA10 / HA12.

Date	Avanc.	Eff.	Météo	Travaux / notes
ven. 25 sept.	40 %	26	Ensoleillé	Travaux : coulage poteaux R+3 (8 m³). Visite du bureau de contrôle : RAS.
sam. 26 sept.	40 %	23	Pluie matinale	Travaux : maçonnerie R+3 et nettoyage de fin de semaine.

Évolution de l'avancement journalier (%)

Effectif moyen : 21 ouvrier(s) / jour

CARBURANT

Indicateur	Valeur
Total litres	325 L
Relevés / anomalies	2 / 0

Date	Litres	Statut
21/09/2026	160	Normal
24/09/2026	165	Normal

BONS DE LIVRAISON

Résumé	Valeur
Nombre de bons	3

Référence	Fournisseur	Date
BL-2026-0353	Cimenterie de Conakry	22/09/2026
BL-2026-0355	Fer et Aciers de Kaloum	24/09/2026
BL-2026-0356	Carrière de Kagbélen	25/09/2026

HSE ET PIÈCES JOINTES

Élément	Détail
Mentions sécurité	1 dans les fiches
Documents déposés	6 (HSE / photos)
Note 1	Travaux : décoffrage dalle R+2 bloc A, ferrailage poteaux R+3. HSE : briefing sécurité du lundi, port des EPI vérifié.

PHOTOS DU CHANTIER**Briefing securite HSE**

21 sept. 2026

**Coffrage poteaux R+2**

22 sept. 2026

**Livraison ciment 300 sacs**

22 sept. 2026

**Elevation murs agglos R+3**

23 sept. 2026

**Ferraillage poutres R+3**

24 sept. 2026

**Coulage dalle R+2**

25 sept. 2026

COMMENTAIRE CHEF DE CHANTIER

Version destinée au maître d'ouvrage : avancement, planning, livraisons et photos, sans aucun montant.

VALIDATION

Établi par (chef de chantier)

Nom : Ibrahima SOW

Date : _____

Signature :

Visa du maître d'ouvrage

Nom : M. Thierno Ousmane DIALLO - Gérant, SCI Les Palmi...

Date : _____

Signature :
